

副本

發文方式：紙本遞送

檔 號：
保存年限：

行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 函

地址：97051花蓮市林政街1號
承辦人：陳慶鵬
電話：03-8325141#224
傳真：03-8327446

受文者：本處鍾技士少強

發文日期：中華民國108年9月2日
發文字號：花治字第1088220464號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如主旨

主旨：檢送108年8月28日「豐濱鄉浴海段崩塌地處理工程」施工協調會會議紀錄影本1份，請依會議紀錄結論事項積極辦理，請查照。

說明：依據108年8月28日本處電話通知辦理。

正本：力峯營造有限公司、安誼工程顧問有限公司
副本：本處鍾技士少強、本處治山課（均含附件）

處長 楊瑞芬

行政院農委會林務局花蓮林區管理處

「豐濱鄉浴海段崩塌地處理工程」

施工協調會會議紀錄

一、時間：108年8月28日（星期三）下午2時10分整

二、地點：本處治山課

三、主持人：黎技正璧瑞

紀錄：陳技士慶鵬

四、與會人員：

本處治山課：

黎璧瑞

陳慶鵬

安誼工程顧問有限公司：

詹家祺

葉映辰

力峯營造有限公司：

陳建志

五、目前工程施作概況：

1. 本工程 108.01.16 開工(工程期限 120 工作天)，迄 108.08.28(120 工作天)，預定進度 100%、實際進度 90.18%。
2. 部分土石籠及坡腳打樁編柵、縱橫溝尚未施作。


六、討論事項：

1. 土石籠傾斜改善方式。
2. 逾期後進度改善措施。

七、結論：


1. 因現場土石方不足，最外一層 $3\text{m}^3/\text{m}$ 調整為 $1\text{m}^3/\text{m}$ (詳附圖)，減少施作數量依實做數量計算並於竣工圖做修正，廠商已購買之材料由廠商自行吸收。
2. 土石籠傾斜由廠商先行改善，如無法改善至設計圖規定，再由廠商提出加設土包袋等改善方式。
3. 本工程工期至 108 年 8 月 23 日已屆滿，自 8 月 24 日起算逾期，廠商承諾後續工程將於 20 工作天內全數完成，請廠商加派人力趕工，並早日完工報驗。

八、散會：下午 2 時 50 分

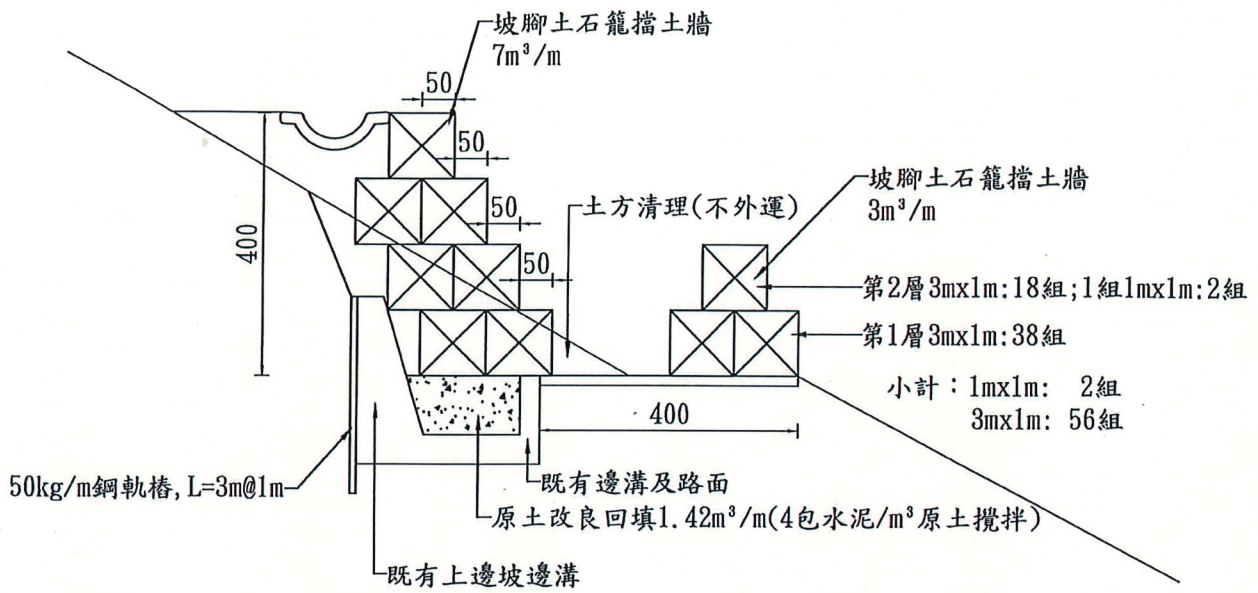

坡腳處理斷面圖(原契約)

S=1/100 Unit:cm

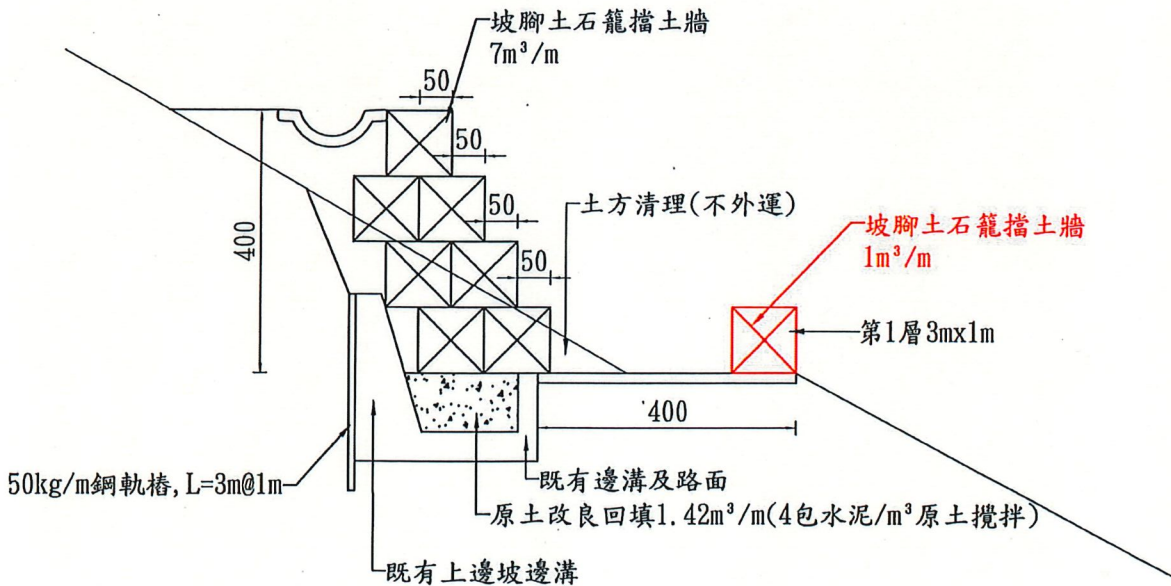

坡腳處理斷面圖(竣工修正)

S=1/100 Unit:cm

